



Projet intégré

Hexadevs

Sprint Review n°0

KinéStats

BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent

INEC0002-3

Haute École Robert Schuman

Bachelier en Informatique

Développement d'applications

24 octobre 2025



Table des matières

1 Informations du sprint	1
1.0.1 Scrum master	1
1.0.2 Git maintenir	1
1.0.3 Récapitulatif	1
1.0.4 Tableaux de bord Clockify	2
1.0.5 Product backlog	2
1.0.6 Burn up chart	3
1.0.7 Burn down chart	3
1.0.8 Issues attribuées et réalisées	4
1.0.9 Réflexion sur le sprint	4
1.0.10 Analyse et diagrammes	6
1.0.11 Mockup	9
2 Rétrospective de sprint	11
2.1 Retour des clients/professeurs	11
2.1.1 Clockify	11
2.1.2 Product backlog	11
2.1.3 Analyse & documents	11
2.1.4 Mockup	11
2.1.5 Autre	11
2.2 Difficultés rencontrés	12
2.2.1 Au niveau du groupe	12
2.2.2 Au niveau individuel	12
2.2.3 Tâches prévues pour le prochain sprint	13



1 Informations du sprint

Ce sprint n°0 s'est déroulé du 08/10/2025 au 22/10/2025/

1.0.1 Scrum master

Scrum Master	Product Owner	Date début	Date fin	N° Sprint	N° Semaine
FANOUX Jean-Elly	Tous	08/10/2025	23/10/2025	0	41 -> 43

TABLE 1.1 – Période du sprint

1.0.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : PAUL Melvyn

Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.

1.0.3 Récapitulatif

Réunions

Sujet	Date & Heure	Absent & Motif
Réunion	09/10/2025 18 :00	Aucun
Réunion	14/10/2025 12 :00	Aucun
Réunion & jeu de rôle	15/10/2025 08 :20	Aucun
Réunion	16/10/2025 13 :00	Aucun
Réunion	17/10/2025 21 :30	Aucun
Réunion	20/10/2025 12 :45	Aucun
Réunion	21/10/2025 10 :00	Aucun

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



1.0.4 Tableaux de bord Clockify

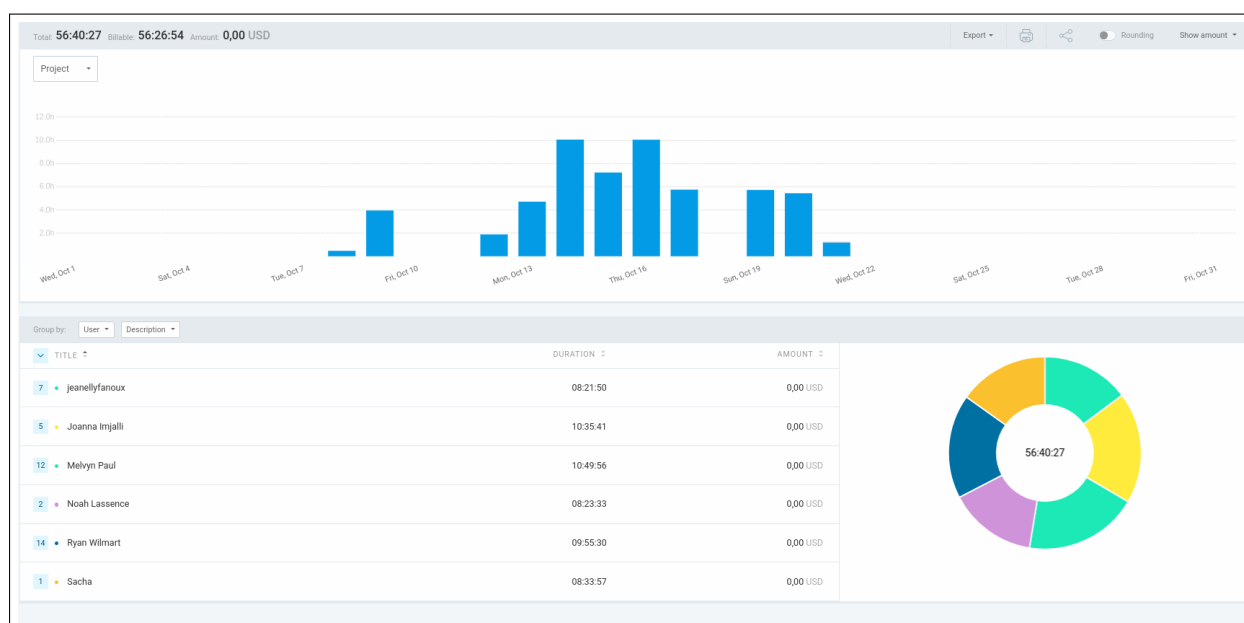


FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify

1.0.5 Product backlog

Sprint Backlog 1			
Tâches	Status	Nb Pers	Assignés
Diagramme de use case	Done	2	Ryan , Jean-Elly
Diagramme de classe (premier jet)	Done	2	Noah, Sacha
Jeu de rôle	Done	6	Tous
Maquette	Done	6	Tous
Product backlog	Done	3	Noah, Melvyn, Joanna
Rédaction de la documentation	In progress	1	Ryan
Glossaire	Done	1	Melvyn
Fiche descriptive des intervenants	Done	1	Melvyn

FIGURE 1.2 – Product Backlog



1.0.6 Burn up chart

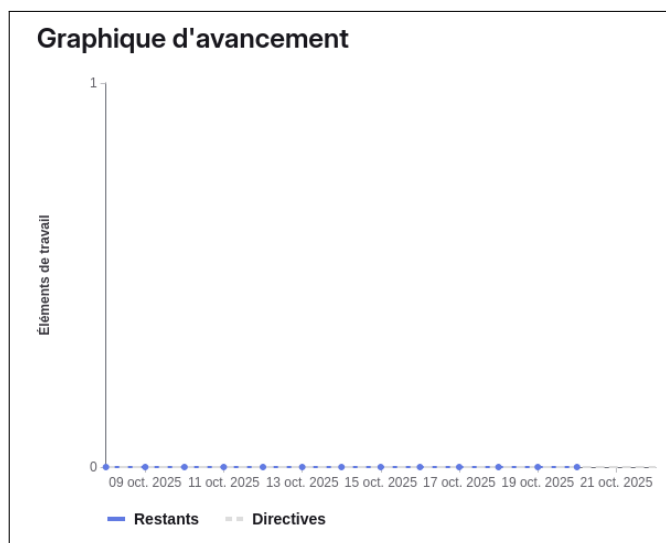


FIGURE 1.3 – Burn up chart

Remarque

Ces graphiques ne sont pas du tout pertinents, nous n'avions pas toutes les informations de base pour bien les générer depuis Gitlab, nous nous sommes renseignés pour faire mieux pour la prochaine fois.

1.0.7 Burn down chart

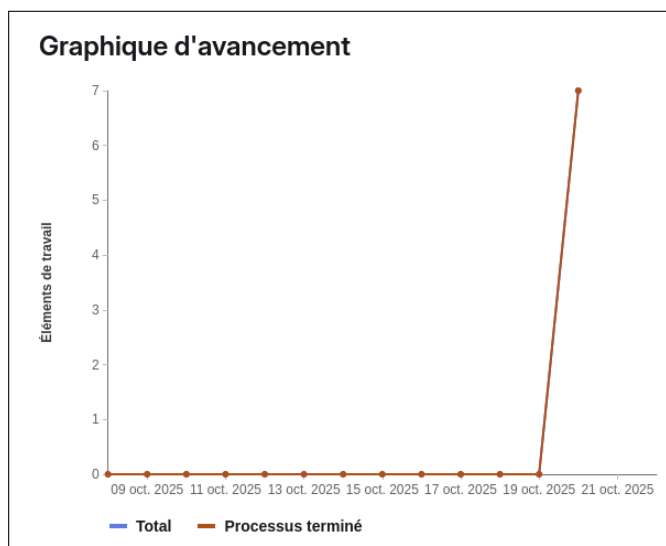


FIGURE 1.4 – Burn down chart

Remarque

Ces graphiques ne sont pas du tout pertinents, nous n'avions pas toutes les informations de base pour bien les générer depuis Gitlab, nous nous sommes renseignés pour faire mieux pour la prochaine fois.



1.0.8 Issues attribuées et réalisées

✓ Faire le diagramme de classe	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#7 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 1 semaine
✓ Faire un use case	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#6 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 1 semaine
✓ Réaliser l'arborescence du projet.	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#5 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 1 semaine
✓ Réaliser le jeu de rôle	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#4 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 2 jours
✓ Réaliser une maquette du programme.	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#3 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 2 jours
📄 Fiche descriptive des intervenants.	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#2 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 1 semaine
✓ Rassembler les notes du SR0 (compte rendu) et le product backlog + glossaire	infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#1 · créé Il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint1	Fermé	Done	fermé Il y a 2 jours

FIGURE 1.5 – Issues attribuées et réalisées

1.0.9 Réflexion sur le sprint

Positif	Négatif	À améliorer
Pas d'absences	Communication (certains)	Burn up & down chart
Assez bonne analyse	-	Mockup

TABLE 1.3 – Rétrospective du sprint — points positifs, négatifs et à améliorer

Au niveau du groupe

"Panique" de début de projet, c'est le temps de comprendre correctement les attentes du client même si ce n'était pas toujours très clair. Le feedback des clients était plutôt positif ainsi que celui des profs. Cela nous met en confiance pour le sprint suivant.



Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	[Nuageux mais ensoleillé] J'ai trouvé l'entente du groupe assez bien. On a juste eu du mal avec la méthode Agile au début, mais on a su rectifier le tir assez vite. Tout se passe pour le mieux pour l'instant. Pour ma part, je pense ne pas avoir bien compris le rôle de Scrum Master et je pense que ce rôle est assez flou pour tout le monde.
Joanna	[Nuageux] Je trouve que l'application de la méthode Agile n'est pas très simple. Surtout que l'on a eu l'impression d'être livrés à nous-mêmes sans de gros soutiens du Scrum Master, mais je suis optimiste quant à l'amélioration de son application. J'ai trouvé que le groupe manquait parfois de communication et s'éparpillait lors des réunions. Points positifs : le groupe est fiable et tout le monde participe. Étant donné que le projet est à ses débuts, j'ai l'impression de ne pas suffisamment contribuer.
Melvyn	[Nuageux] La découverte du sujet, combinée à l'application stricte de la méthode Agile, n'est pas chose aisée. Je ne me sens pas totalement à l'aise avec toutes ces nouveautés, mais cela viendra. Le groupe est fiable et tout le monde réalise le travail qui lui est imparti. Petit point négatif sur les rôles : il semble que les rôles de Scrum Master et de Product Owner soient encore flous pour tout le monde.
Noah	[Nuageux mais ensoleillé] Je trouve que l'objectif de ce projet n'est vraiment pas simple, mais ça sera souvent comme ça à l'avenir, alors il faut faire avec. On avait un peu de mal avec la méthode Agile au début, mais on a su rectifier le tir, et depuis je me sens bien mieux. On doit encore s'adapter un peu à la méthode, mais ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure. Je me sens vraiment à l'aise avec le groupe et je sens que tout le monde est impliqué.
Ryan	[Nuageux mais ensoleillé] Au début, j'ai eu un peu de mal à "<i>délimiter</i>" le projet (savoir quoi faire en premier, à quoi faire attention, ...), mais après de nombreuses réunions, nous nous sommes mis d'accord et avons compris la consigne. Le projet ne me paraît, pour le moment, pas spécialement compliqué, donc je suis assez confiant. De plus, toutes les personnes du groupe communiquent, tout le monde exprime ses idées et tout le monde s'écoute, c'est assez agréable.
Sacha	[Nuageux mais ensoleillé] Je trouve que ce premier sprint s'est plutôt bien passé. Nous avons eu un démarrage un peu lent car nous étions tous dans le flou. Nous nous sommesentraîdés que se soit dans la compréhension du sujet ou dans l'application de la méthode agile ce qui est un gros point positif.

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe



1.0.10 Analyse et diagrammes

Use case partiels

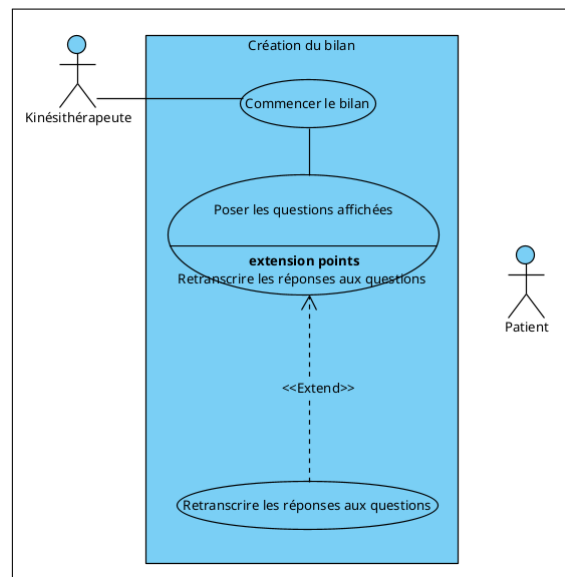


FIGURE 1.6 – Use case de la création du bilan

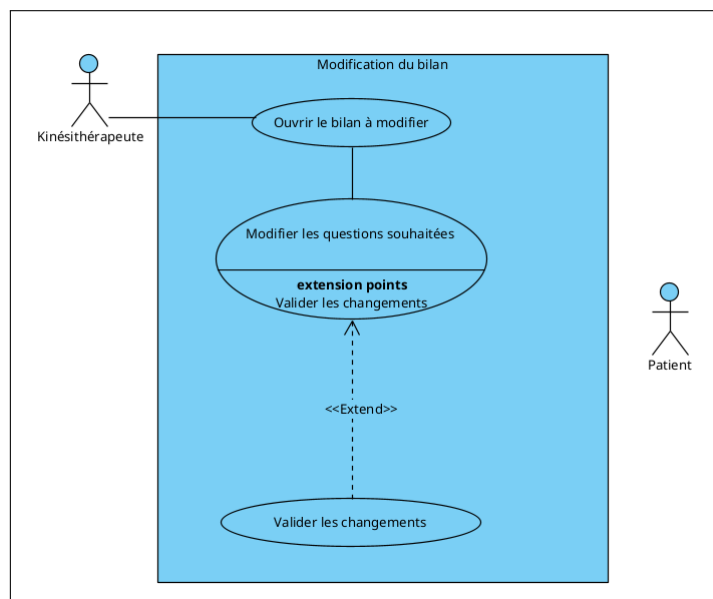


FIGURE 1.7 – Use case de la modification du bilan

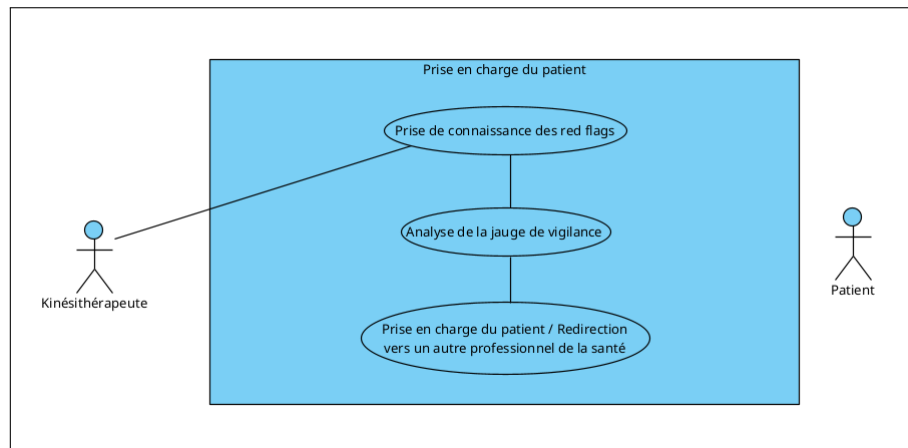


FIGURE 1.8 – Use case de la prise en charge du patient

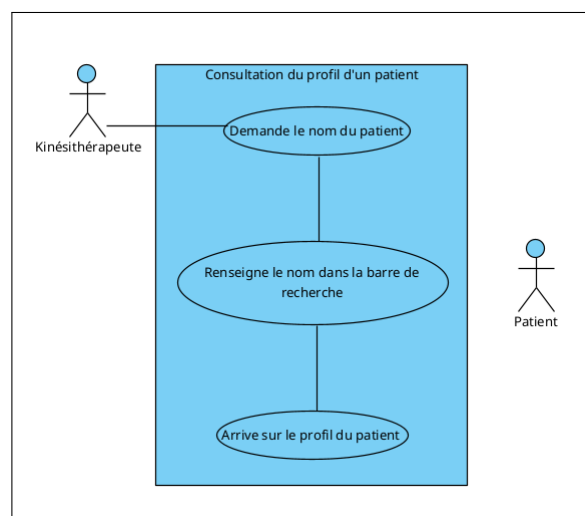


FIGURE 1.9 – Use case de la consultation du profil du patient

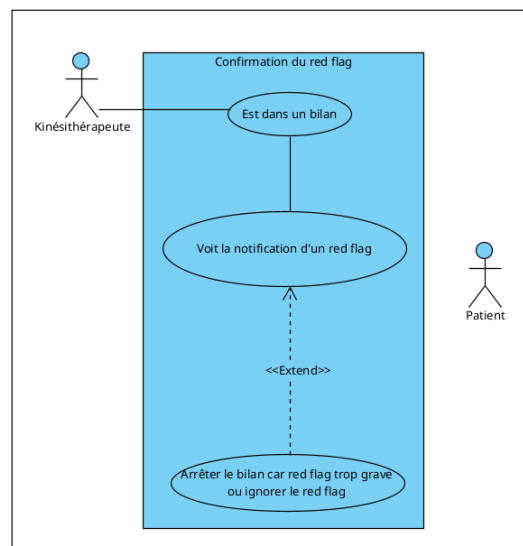


FIGURE 1.10 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan



Diagrammes de classes partiel

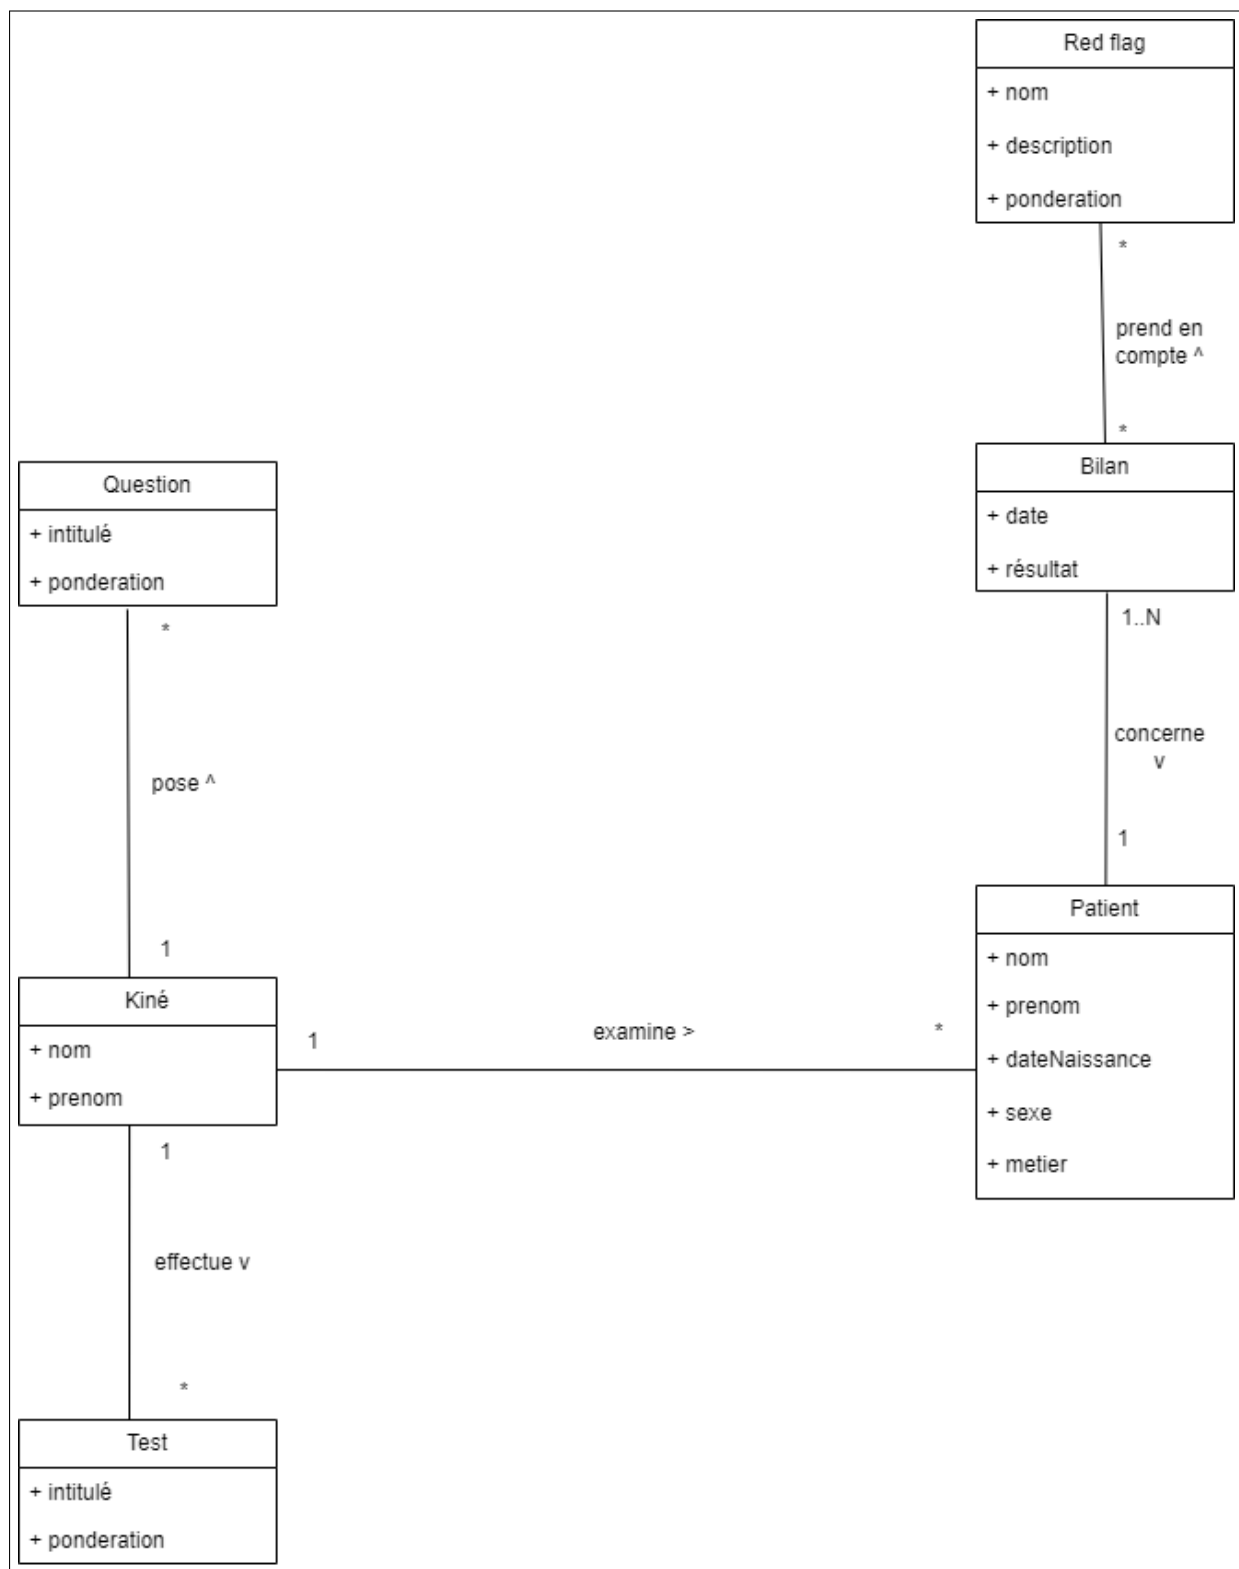


FIGURE 1.11 – Premier jet du diagramme de classe



1.0.11 Mockup

Nom cabinet kine - NOM KINE

BILAN Historique Déconnexion

Anamnèse

Encodage du prior

Prénom

Nom

Profession

Sexe

Activité(s) sportive(s)

Enregistrer

Pathologie potentielle

Probabilité - Prior

Pathologie potentielle :

Pathologies :

Ligaments croisés

...

Pathologie potentielle 1 :
Ligaments croisés
80%

Pathologie potentielle 2 :
Fracture du tibia
60%

Pathologie potentielle 3 :
Entorse
30%

Commencer le bilan

FIGURE 1.12 – Mockup de la page d’encodage des données du patient

Nom cabinet kine - NOM KINE

Patients Déconnexion

Retour

BILAN

Nom Patient

Question 1 :
Avez-vous eu un traumatisme important récemment ? (Chute, accident, ...)

Question 2 :
Avez-vous perdu du poids sans raison ces derniers mois ?

Question 3 :
Avez-vous de la fièvre ou des sueurs nocturnes ?

Question 4 :
Avez-vous des antécédents de cancer ?

Question 5 :
Prenez-vous des corticoïdes au long cours ?

Test 1 :
Flexion antérieure

Test 2 :
Test de Lasègue

Test 3 :
Flexion

Test 4 :
Rotation Droite

Test 5 :
Rotation Gauche

Mettre en pause le bilan

Terminer le bilan

FIGURE 1.13 – Mockup de la page du déroulement du bilan

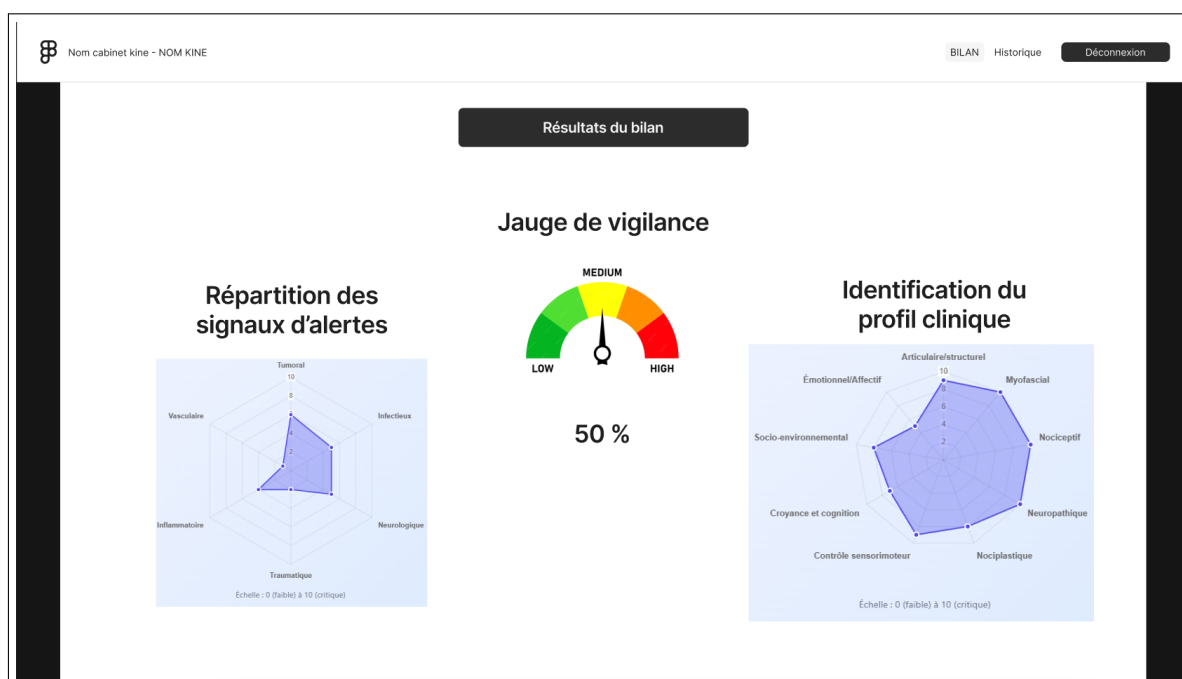


FIGURE 1.14 – Mockup de la page de résultats du bilan



2 Rétrospective de sprint

2.1 Retour des clients/professeurs

2.1.1 Clockify

- Ok, assez équilibré

2.1.2 Product backlog

- Pas de remarques

2.1.3 Analyse & documents

- Pas de remarques

2.1.4 Mockup

- Plutôt ok, mais certaines choses à retravailler / ajouter

2.1.5 Autre

- Problèmes avec la méthode Agile, à améliorer



2.2 Difficultés rencontrés

2.2.1 Au niveau du groupe

"Panique" de début de projet, c'est le temps de comprendre correctement les attentes du client même si ce n'était pas toujours très clair. Le feedback des clients était plutôt positif ainsi que celui des profs. Cela nous met en confiance pour le sprint suivant.

2.2.2 Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	— Compréhension du sujet — Rôle Scrum Master
Joanna	— Compréhension du domaine métier — Application de la méthode agile — Communication avec les autres membres
Melvyn	— Sujet technique — Graphiques Burn Up et Burn Down
Noah	— Compréhension du sujet — Burn up/down chart — Application de la méthode agile
Ryan	— Sujet dans un domaine nouveau — Burn up/down chart : peu de précisions — Mise en pratique de la méthode agile
Sacha	— Comprendre ce que recherche réellement le client — Application de la méthode agile

TABLE 2.1 – Ressenti individuel des difficultés des membres du groupe



2.2.3 Tâches prévues pour le prochain sprint

Voici la liste des tâches prévues pour le prochain sprint :

- Diagramme de classe
- Nouvelle architecture
- Analyse globale
- Anamnèse
- Base de données de test

Remarque

Cette liste est non exhaustive ; Certaines choses vont naturellement se rajouter au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors du prochain sprint.
