



Projet intégré

Hexadevs

Sprint Review n°4

KinéStats

BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent

INEC0002-3

Haute École Robert Schuman

Bachelier en Informatique

Développement d'applications

17 Décembre 2025



Table des matières

1 Informations du sprint	1
1.1 Scrum master	1
1.2 Git maintenir	1
1.3 Récapitulatif	2
1.3.1 Réunions	2
1.3.2 Tableaux de bord Clockify	3
1.3.3 Product backlog	4
1.3.4 Burn down chart	5
1.3.5 Burn up chart	5
1.3.6 Issues attribuées et réalisées	6
1.4 Réflexion sur le sprint	8
1.4.1 Vue d'ensemble	8
1.4.2 Au niveau du groupe	8
1.4.3 Au niveau individuel	9
1.5 Analyse et diagrammes	10
1.5.1 Use case partiels	10
1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)	13
1.5.3 Mockup	14
2 Pages de l'application	15
3 Base de données	26
4 Fonctionnalités ajoutées	27
4.1 Sécurisation des <code>controllers</code>	27



4.2	Test du calcul de Bayes	27
4.3	Exportation du bilan au format PDF	27
4.4	Optimisation pour tablettes	27
5	Rétrospective de sprint	28
5.1	Retranscription des retours obtenus à l'oral	28
5.1.1	Clockify	28
5.1.2	Product backlog	28
5.1.3	Pages web	28
5.1.4	Autre	28
5.2	Difficultés rencontrées	29
5.2.1	Au niveau du groupe	29
5.2.2	Au niveau individuel	29
5.3	Tâches prévues pour le prochain sprint	30



1 Informations du sprint

Ce sprint n°4 s'est déroulé du 03/12/2025 au 16/12/2025.

1.1 Scrum master

Scrum Master	Product Owner	Date début	Date fin	N° Sprint	N° Semaine
MEUNIER Sacha	Tous	03/12/2025	16/12/2025	4	49 -> 51

TABLE 1.1 – Période du sprint

1.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : WILMART Ryan

Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.



1.3 Récapitulatif

1.3.1 Réunions

Sujet	Date & Heure	Absent & Motif
Réunion d'après Sprint Review	03/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	04/12/2025 20 :00	Aucun
Daily meeting	05/12/2025 20 :00	Aucun
Daily meeting	06/12/2025 17 :30	Aucun
Daily meeting	08/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	09/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting (Durant les heures prévues à l'école)	10/12/2025 08 :30	Aucun
Daily meeting (Durant les heures prévues à l'école)	11/12/2025 08 :30	Aucun
Daily meeting	12/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	15/12/2025 20 :00	Aucun
Daily meeting	16/12/2025 17 :00	Aucun

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



1.3.2 Tableaux de bord Clockify

Tableau de bord Clockify du sprint actuel

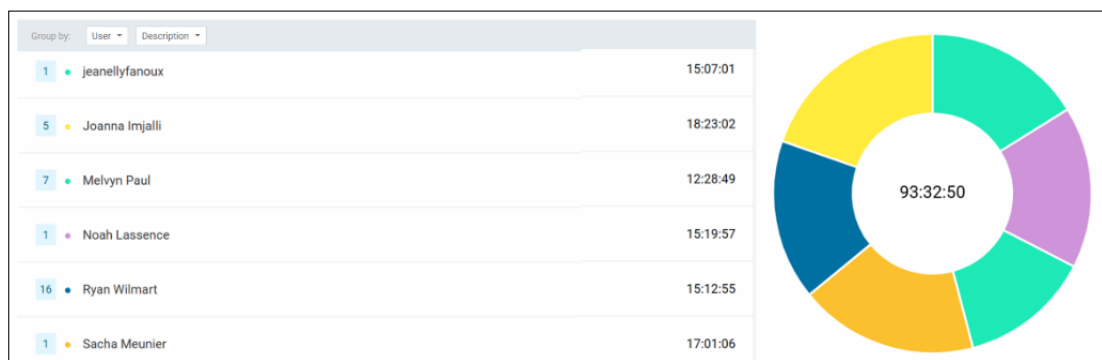


FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify du sprint actuel

Graphique Clockify du sprint actuel

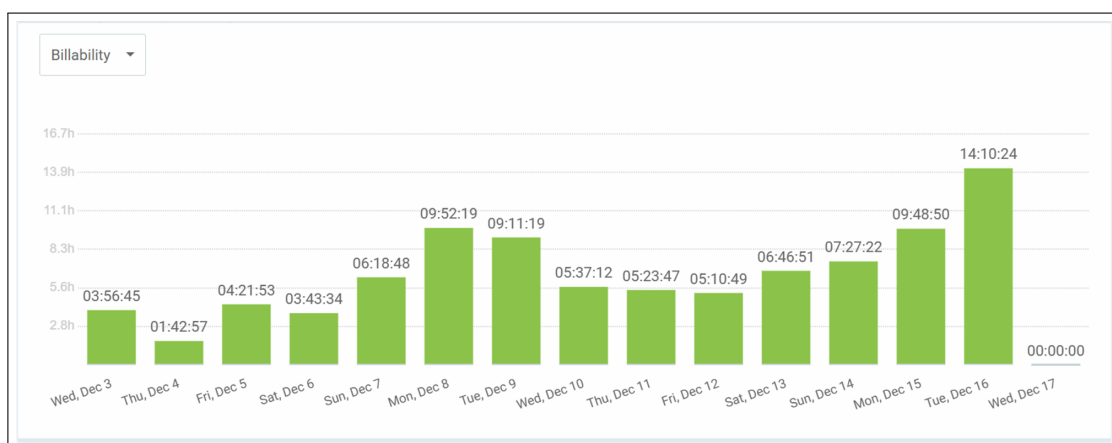


FIGURE 1.2 – Graphique Clockify du sprint actuel

Tableau de bord Clockify du projet global

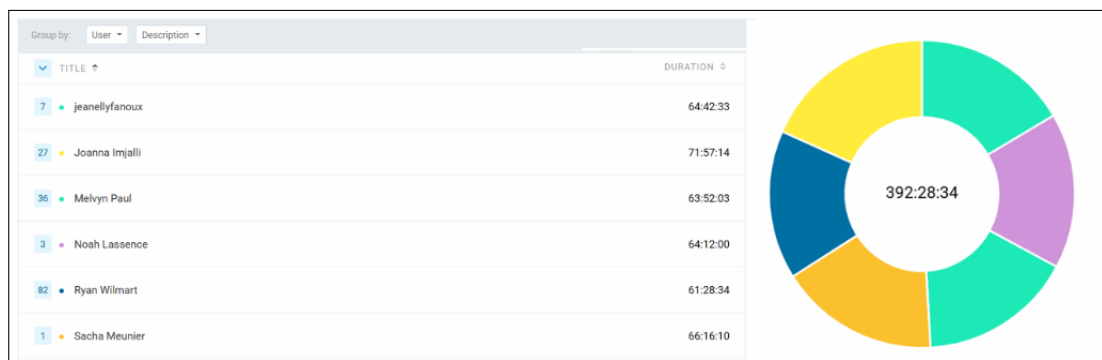


FIGURE 1.3 – Tableau de bord Clockify du projet global



1.3.3 Product backlog

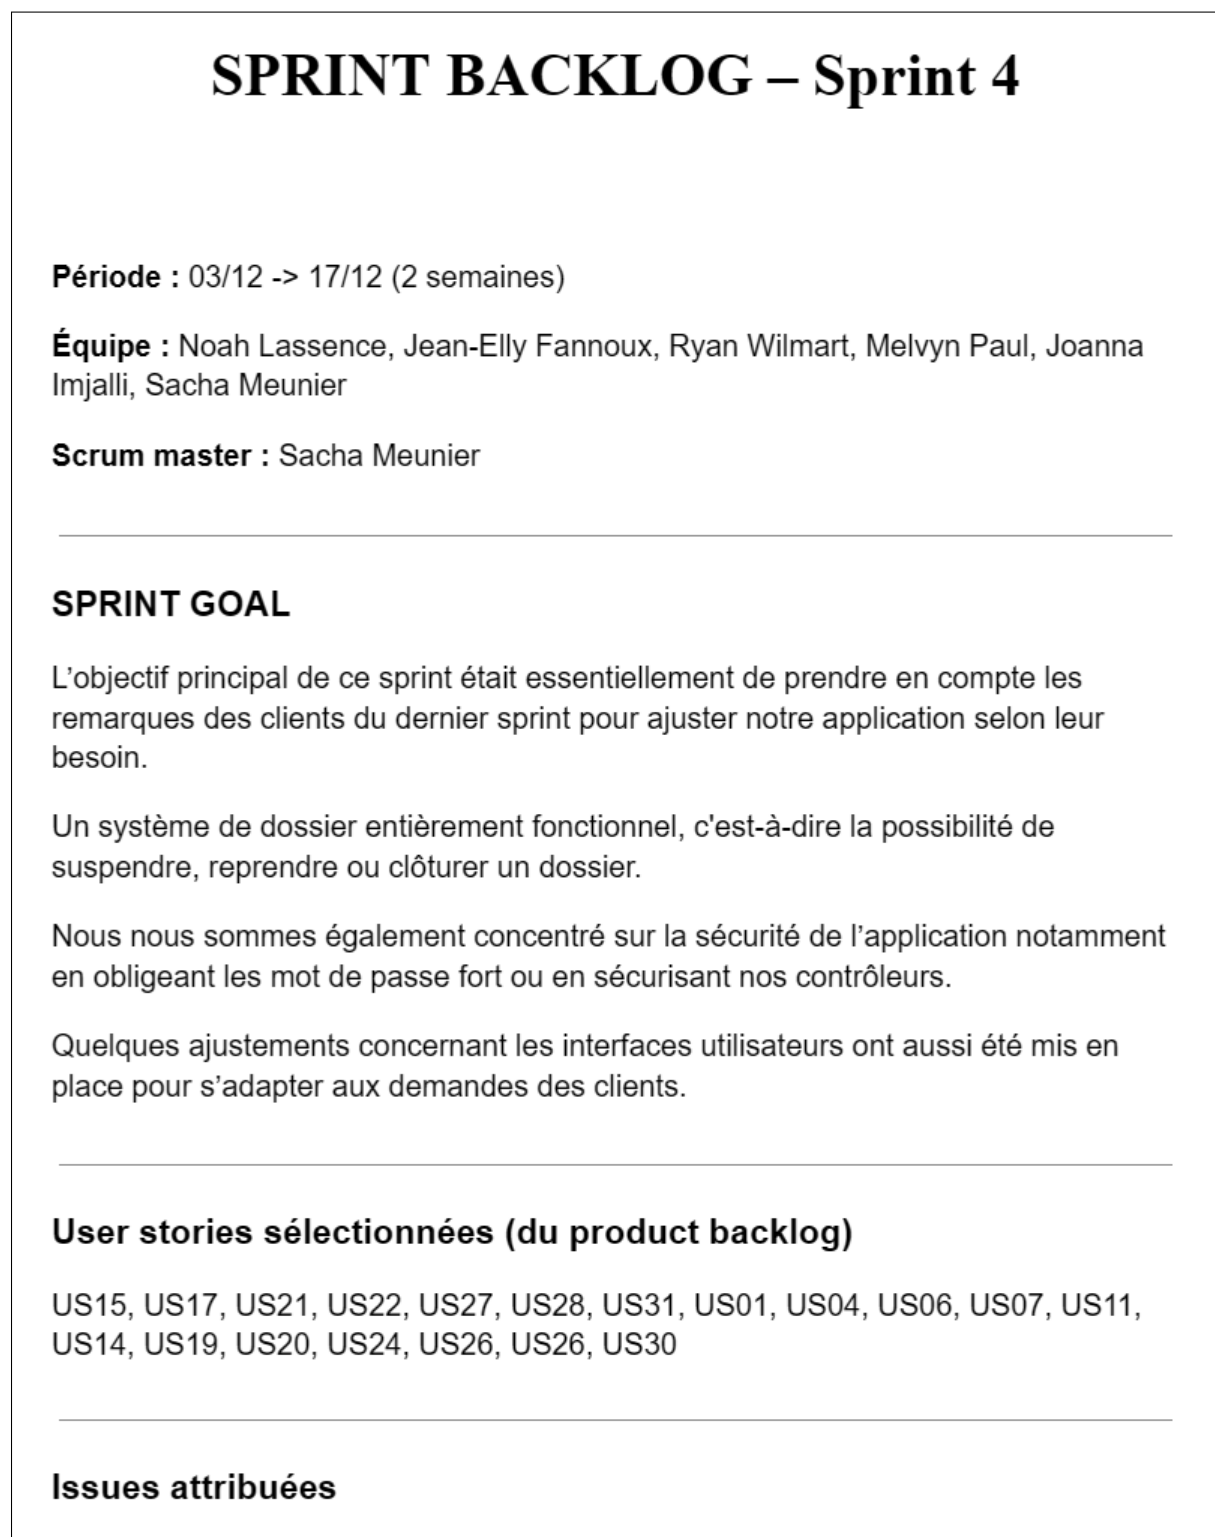


FIGURE 1.4 – Product Backlog



1.3.4 Burn down chart

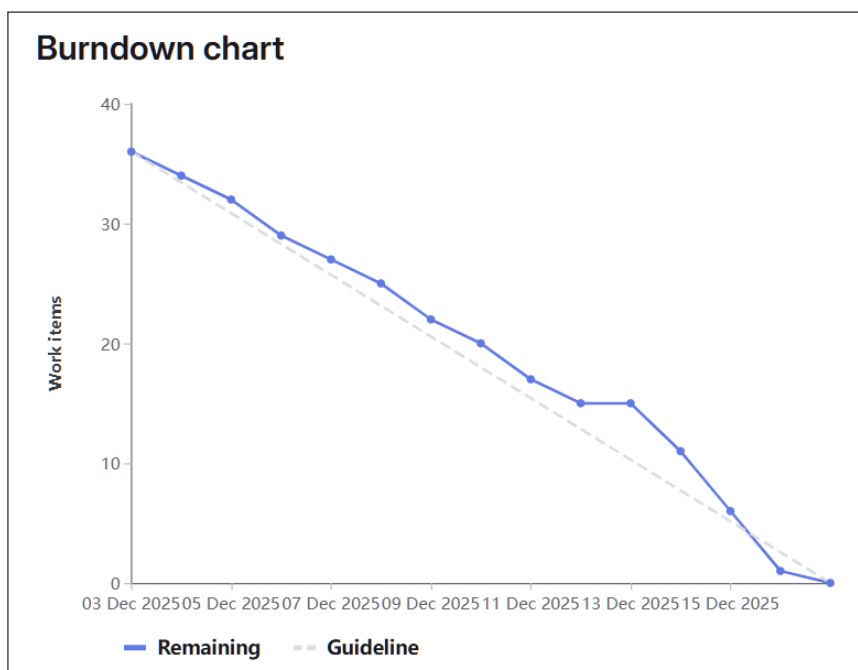


FIGURE 1.5 – Burn down chart

1.3.5 Burn up chart

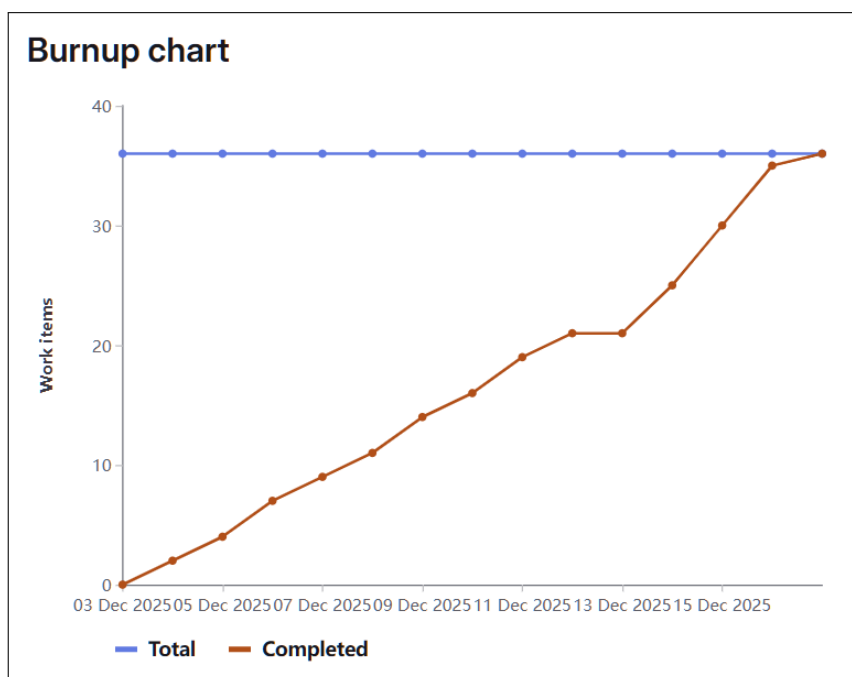


FIGURE 1.6 – Burn up chart

Remarque

Nous sommes satisfaits de nos graphiques, ils respectent ce que Mr Schalkwijk nous a enseigné pour la méthode AGILE.



1.3.6 Issues attribuées et réalisées

☐ Anonymiser automatiquement un patient au delà de 20 ans infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#113 · created 3 weeks ago by Melvyn Paul · 2 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 1 week ago
☐ Modifier la jauge (couleurs) infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#112 · created 3 weeks ago by Melvyn Paul · 3 · Sprint 5 · 2h	Closed 1 Done closed 2 weeks ago
☐ Rendre fonctionnel le milieu de prise en charge infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#111 · created 3 weeks ago by Melvyn Paul · 4 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 1 week ago
☐ Faire en sorte de devoir créer un mot de passe fort infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#110 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 1 week ago
☐ Remplacer suspendu par inactif infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#109 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 5m	Closed Done closed 3 weeks ago
☐ Optimiser toutes les pages pour le format tablette infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#108 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5	Closed 1 Done closed 1 week ago
☐ Sauvegarder les données du bilan liées aux axes infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#107 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 8 · Sprint 5	Closed Done closed 1 week ago
☐ Gérer tous les types de questions infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#106 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 3h	Closed Done closed 2 weeks ago
☐ Télécharger le theme LUX infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#105 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 1 · Sprint 5 · 15m	Closed Done closed 3 weeks ago
☐ déplacer le code JS infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#104 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 1 week ago
☐ Documenter les controleurs infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#103 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 2 weeks ago
☐ Repasser dans les controleurs pour virer l'inutile infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#102 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 30m	Closed Done closed 2 weeks ago
☐ Lire les documents RGPD infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#101 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 1 week ago
☐ Masquer le volet des tests infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#100 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 2 weeks ago

FIGURE 1.7 – Première partie des issues réalisées



Superposer le bilan initial et le dernier bilan infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#99 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 2 weeks ago
Classe médecin traitant infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#98 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 5m	Closed Done closed 2 weeks ago
Suggestion d'ajout de médecin traitant infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#97 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 2 weeks ago
Sécuriser les controleurs infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#96 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 1h 30m	Closed Done closed 1 week ago
Ajouter les fils d'arianne manquants infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#95 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 1 week ago
Faire fonctionner la proba/ pathologie dans les résultats du bilan infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#94 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 8 · Sprint 5 · 4h	Closed Done closed 1 week ago
Récupérer les réponses dans les détails du bilan infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#93 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 4 · Sprint 5	Closed Done closed 1 week ago
Faire fonctionner les toiles d'araignées infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#92 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 8 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 1 week ago
Commencer la doc du sprint infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#91 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 1 · Sprint 5 · 30m	Closed Done closed 2 weeks ago
Terminer la doc du sprint précédent infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#90 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 1 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 2 weeks ago
Ajouter le pays au patient infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#89 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 10m	Closed Done closed 1 week ago
Validation du numero INAMI infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#88 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 5 · 30m	Closed Done closed 2 weeks ago
Modifier le script BD pour lier les questions aux pathologies infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#87 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5	Closed Done closed 1 week ago
Ajouter la modifis. des RVs dans la page admin infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#86 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 4 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 1 week ago

FIGURE 1.8 – Seconde partie des issues réalisées

Ajouter la modifis. des RVs dans la page admin infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#86 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 4 · Sprint 5 · 1h	Closed Done closed 1 week ago
Exportation PDF infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#85 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 1 week ago
Finaliser la page résultats infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#84 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 6 · Sprint 5	Closed Done closed 1 week ago
Agrandir les boutons des redflags/examen clinique infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#83 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 5 · 30m	Closed Done closed 2 weeks ago
Réparer la suggestion de test infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#82 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 30m	Closed Done closed 2 weeks ago
Animations infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#81 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 1 · Sprint 5 · 30m	Closed Done closed 1 week ago
Double champ de mot de passe pour l'ajout et modif de kiné infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#80 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 5 · 15m	Closed Done closed 2 weeks ago
Supprimer la jauge de la page redflags infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#79 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 1 · Sprint 5 · 5m	Closed Done closed 2 weeks ago
Faire apparaitre la jauge dans les details du bilan infohiers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#78 · created 3 weeks ago by Noah Lassence · 4 · Sprint 5 · 2h	Closed Done closed 2 weeks ago

FIGURE 1.9 – Troisième partie des issues réalisées

Nous pensons que nous avons vraiment bien compris comment diviser les issues pour en faire des ni trop petites, ni trop grandes, nous sommes assez contents sur ce point.



1.4 Réflexion sur le sprint

1.4.1 Vue d'ensemble

Nous sommes tous très contents de ce sprint, car nous n'avons eu aucun absent, nous avons su maintenir de beaux graphiques **BurnUp** et **BurnDown** et nous avons pu corriger efficacement les remarques du dernier **sprint review**.

Positif	Négatif	À améliorer
Pas d'absences	Demande des clients qui changent très souvent	-
Très bonne communication	« Rush de fin », à éviter pour le futur	-
Très bonne entraide	-	-

TABLE 1.3 – Rétrospective du sprint — points positifs, négatifs et à améliorer

1.4.2 Au niveau du groupe

Ce sprint s'est déroulé de manière très fluide et nous en sommes tous satisfaits. Nous nous rapprochons de la version finale du projet, ce qui est encourageant à seulement 9 jours du rendu. Chaque membre s'investit pleinement dans ses tâches, la cohésion de groupe reste excellente, et nous abordons la fin du projet avec confiance.



1.4.3 Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	[Ensoleillé] Je suis très content de ce sprint. Que ce soit au niveau backend ou frontend nous nous rapprochons de la version finale, ce qui est une bonne chose à 9 jours du rendu.
Joanna	[Ensoleillé] Ce sprint était satisfaisant. Nous avons pu avancer dans le projet et nous rapprocher de la version finale. Tout le monde s'investit dans les tâches qui ont été attribuées.
Melvyn	[Ensoleillé] Je suis satisfait du travail accompli. Je suis aussi satisfait du projet en lui-même, chaque fonctionnalité est implémentée et il ne nous reste qu'à repasser sur les bugs restants, refactorer le code et préparer les livrables. Nous sommes efficaces et je me sens bien dans mon groupe. La grippe m'a mis un coup d'arrêt sur la fin du sprint mais ayant bien avancé dans mes issues juste avant, aucun impact n'a eu lieu.
Noah	[Ensoleillé] Ce sprint est celui que j'ai le plus apprécié, on a tranquillement avancé en corrigeant les remarques du dernier sprint review et je suis satisfait du travail fourni par le groupe et moi-même, en espérant qu'on reste dans cet état d'esprit pour le temps qu'il reste.
Ryan	[Ensoleillé] J'ai vraiment bien aimé ce sprint, il était très fluide. De plus, les clients sont contents du produit, et nous approchons de la fin, sereins.
Sacha	[Ensoleillé] J'ai apprécié ce sprint car nous avons le sentiment de vraiment bien avancer et de répondre aux attentes des clients. Nous avons tenu compte des remarques pour adapter notre projet de façon efficace et organisée. La cohésion de groupe est toujours présente.

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe



1.5 Analyse et diagrammes

1.5.1 Use case partiels

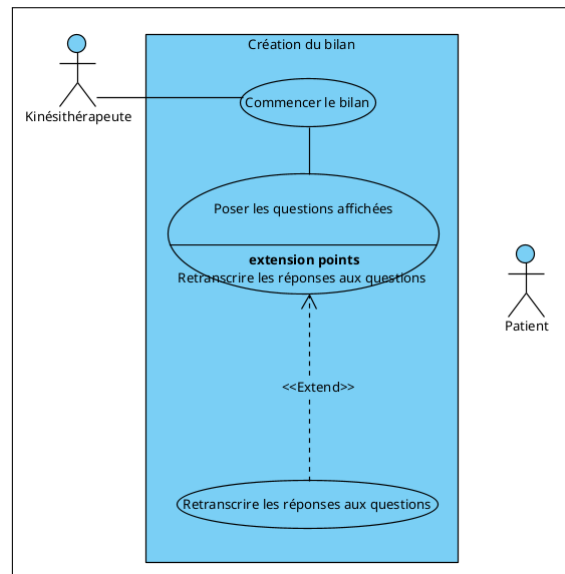


FIGURE 1.10 – Use case de la création du bilan

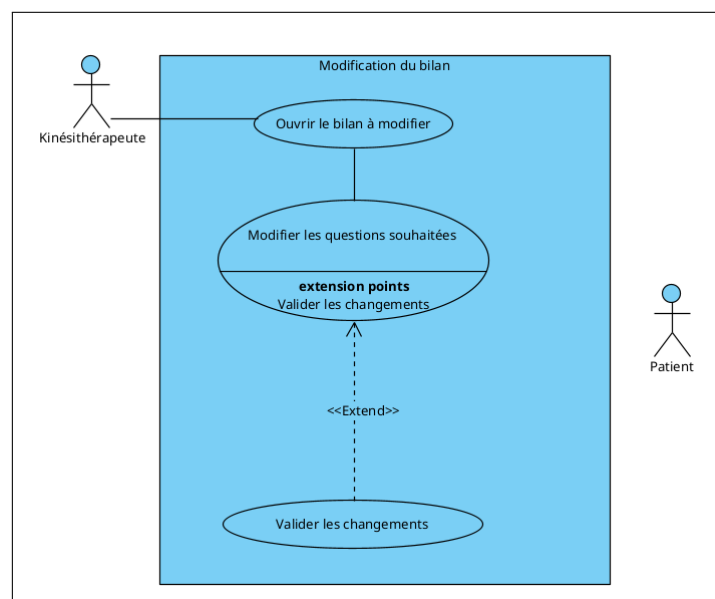


FIGURE 1.11 – Use case de la modification du bilan

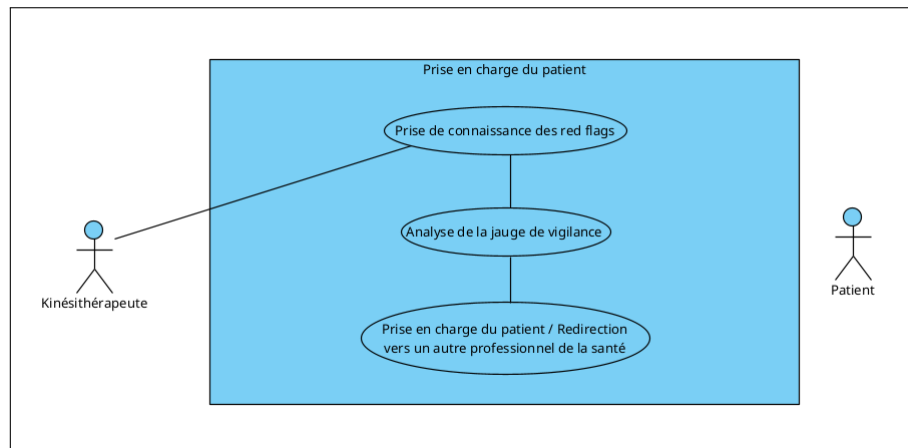


FIGURE 1.12 – Use case de la prise en charge du patient

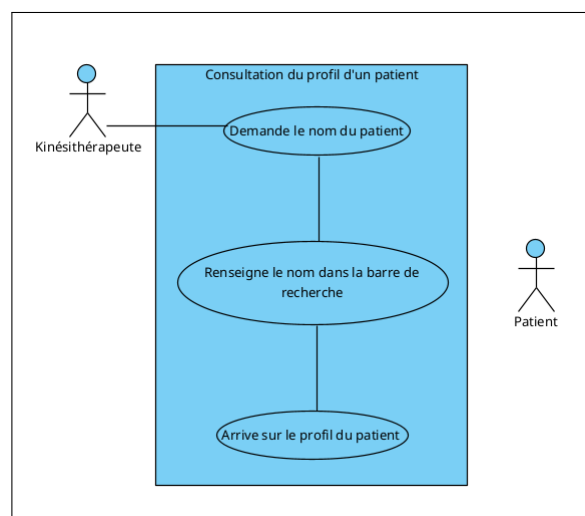


FIGURE 1.13 – Use case de la consultation du profil du patient

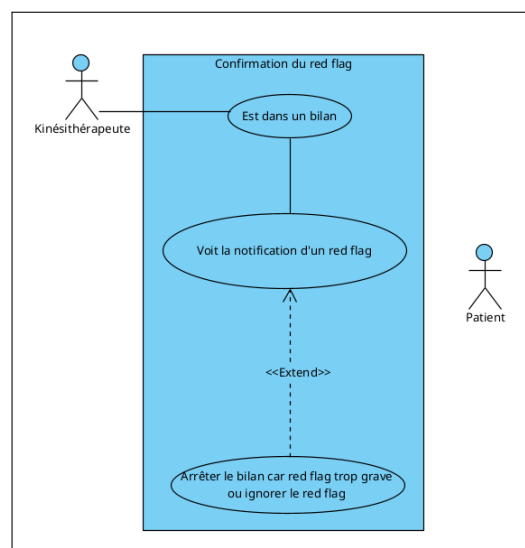


FIGURE 1.14 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan

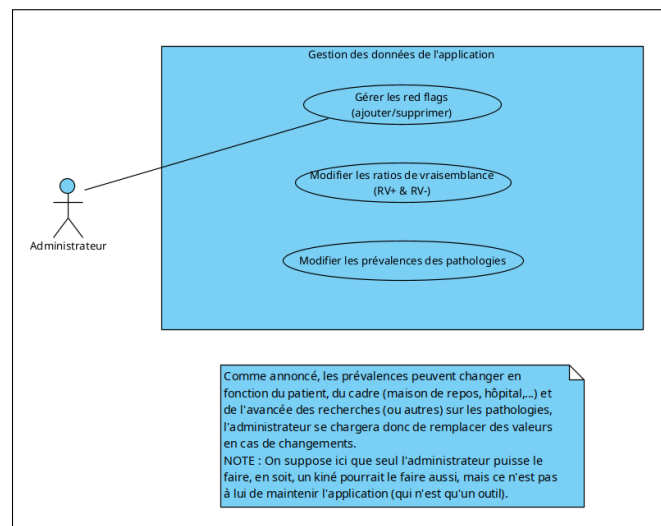


FIGURE 1.15 – Use case de l'administration de l'application

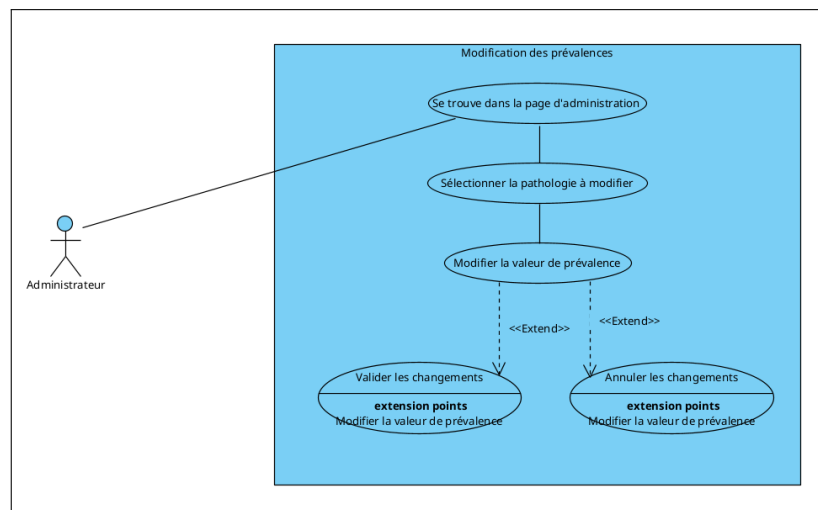


FIGURE 1.16 – Use case de modification des prévalences

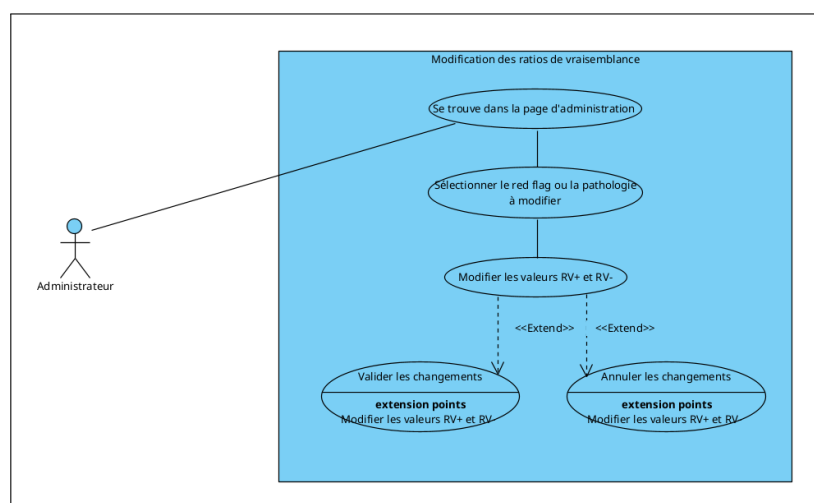


FIGURE 1.17 – Use case de modification des vraisemblances



1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)

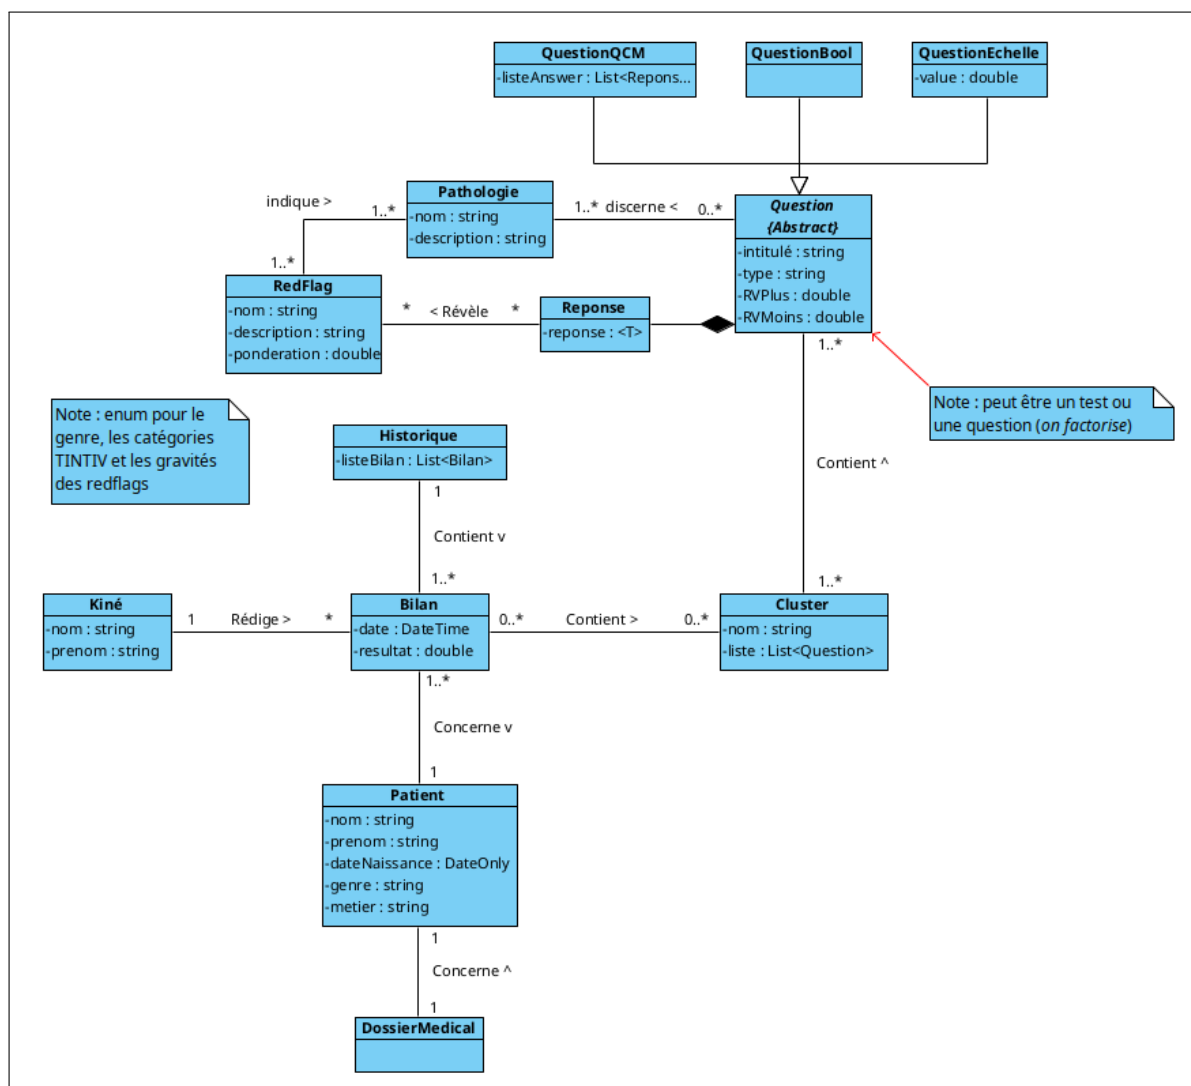


FIGURE 1.18 – Second jet du diagramme de classe

Remarque

Le refactor de ce diagramme est prévu pour le prochain sprint : le sprint final.



1.5.3 Mockup

Les **mockups** ne sont plus pertinents dans ce document à ce stade du projet car nous avons déjà une belle interface de l'application qui dépasse même les **mockups** (*vu que nous avons implémenté plus de fonctionnalités par exemple*).



2 Pages de l'application

Voici les différentes pages actuelles de notre application (toutes les pages sont fonctionnelles).

Remarque

Afin de ne pas polluer inutilement le document, seules les pages seront montrées (pas les **popups** par exemple, qui sont inutiles à montrer, à moins qu'elles ne présentent quelque chose de très important).

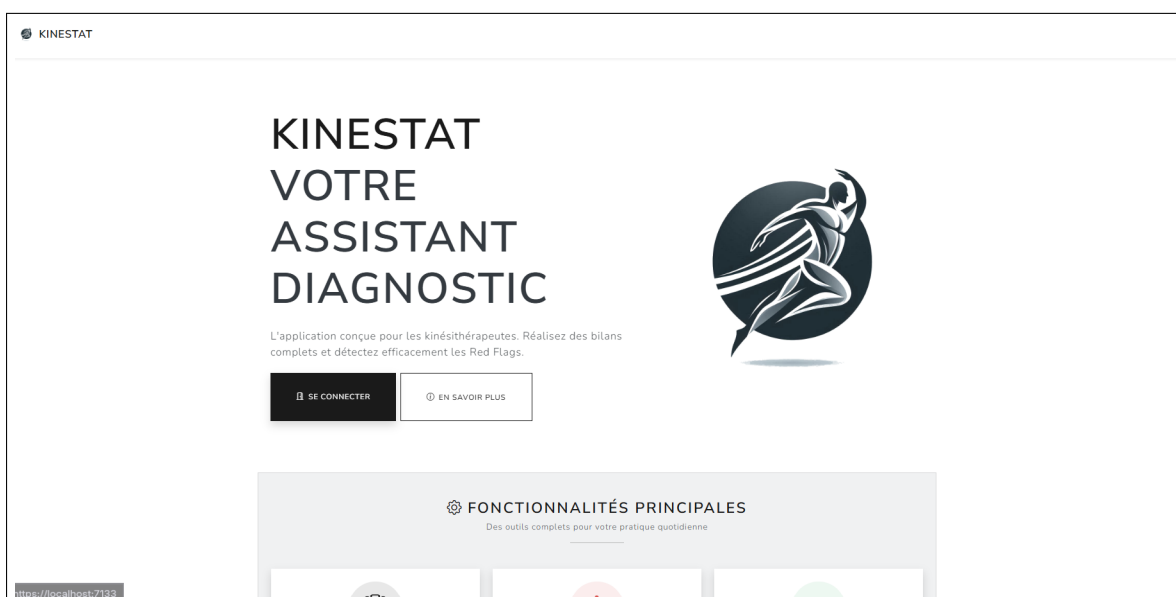


FIGURE 2.1 – Page de bienvenue

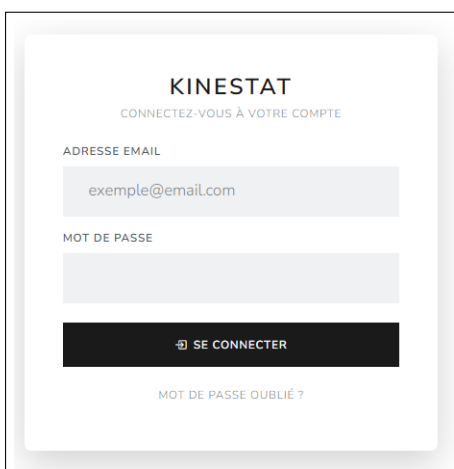


FIGURE 2.2 – Page de connexion



CHANGER LE MOT DE PASSE

Modification sécurisée de votre mot de passe administrateur

SÉCURITÉ DU COMPTE

Mot de passe actuel

Entrez votre mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Entrez le nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Confirmez le nouveau mot de passe

EXIGENCES DU MOT DE PASSE

- Au moins 8 caractères
- Au moins une majuscule (A-Z)
- Au moins une minuscule (a-z)
- Au moins un chiffre (0-9)
- Au moins un caractère spécial (!@#\$%^&*...)

CHANGER LE MOT DE PASSE

ANNULER

FIGURE 2.3 – Page de changement de mot de passe de l'administrateur

ADMINISTRATION DES QUESTIONS

Rechercher une question

Résultats : 190 question(s)

Title de la question...

LISTE DES QUESTIONS

TITLE	CATÉGORIE	RV+	RV-	SOURCE	ACTIONS
Age > 50 ans	Articulaire / Structurel	3,00	0,53	Livre exam et bilan	
Changement dans l'ecart inter-epineux	Articulaire / Structurel	8,84	0,17	Expertise Clinique	
Compression +	Articulaire / Structurel	4,00	0,50	Expertise Clinique	
diminution de la flexion lombaire	Articulaire / Structurel	1,90	0,73	test clinique	
Diminution de la lordose lombale	Articulaire / Structurel	1,80	0,80	test clinique	

FIGURE 2.4 – Page de changement des questions de l'administrateur

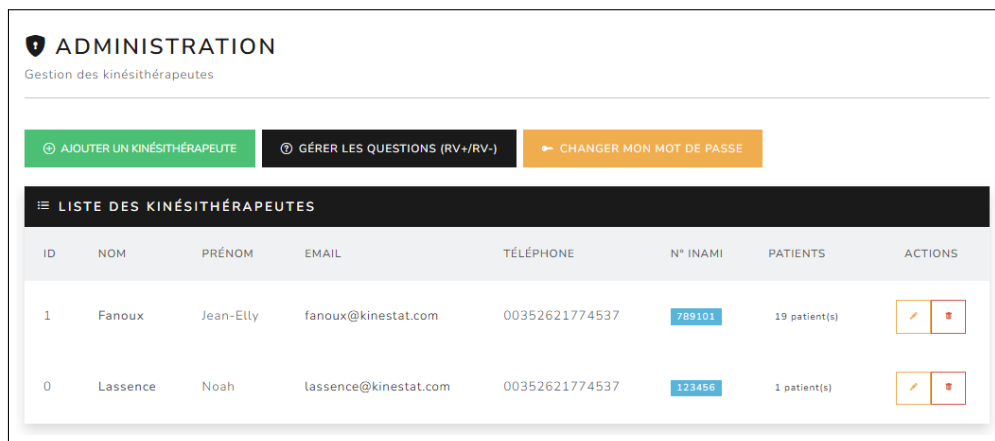


FIGURE 2.5 – Page d'accueil de l'administrateur

AJOUTER UN KINÉSITHÉRAPEUTE

Prénom:

Nom:

Email:

Téléphone:

Mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Numéro INAMI:

FIGURE 2.6 – Popup d'ajout de kinésithérapeute de l'administrateur

MODIFIER UN KINÉSITHÉRAPEUTE

Prénom:

Nom:

Email:

Téléphone:

Nouveau mot de passe:

Numéro INAMI:

FIGURE 2.7 – Popup de modification de kinésithérapeute de l'administrateur



Ensuite, nous passons à la partie « Kinésithérapeute » :

PATIENTS

NOUVEAU PATIENT

Rechercher

Tous les statuts

NOM	PRÉNOM	EMAIL	GENRE	STATUT	NAISSANCE	TÉLÉPHONE	ACTIONS
Roussel	Eva	eva.rousseau@example.com	F	Actif	15/08/1996	+32 490 232 425	

1

FIGURE 2.8 – Page d'accueil du kinésithérapeute

NOUVEAU PATIENT

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM * PRÉNOM * GENRE *
 -- Sélectionner --

PAYS * N° SÉCURITÉ SOCIALE *
 -- Sélectionner -- XX.XX.XX-XX.XX

DATE DE NAISSANCE * TÉLÉPHONE * EMAIL *
 jj/mm/aaaa

ADRESSE

INFORMATIONS MÉDICALES

POIDS (KG) TAILLE (CM) MÉDECIN TRAITANT
 -- Aucun médecin --

AJOUTER UN NOUVEAU MÉDECIN

ANNULER CRÉER LE PATIENT

FIGURE 2.9 – Popup d'ajout de patient



ANAMNÈSE

Alexandre Leroy

← RETOUR À LA LISTE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

MODIFIER

Nom	Prénom	Statut
Leroy	Alexandre	Inactif
Genre	Date de naissance	
Homme	05/11/2000	
Adresse	Téléphone	Email
Chaussée de Charleroi 78, 1060 Bruxelles	+32 473 987 654	alexandre.leroy@example.com
Poids (kg)	Taille (cm)	
80	175	
N° Sécurité sociale	Médecin traitant	N° INAMI du médecin
34567890123	Non renseigné	Non renseigné

FIGURE 2.10 – Page d'anamnèse du patient : Partie 1

INFORMATIONS MÉDICALES

MODIFIER

Profession
 Non renseignée

Activités physiques
 Non renseignées

Antécédents médicaux
 Non renseignés

Médication actuelle
 Non renseignée

DOSSIERS

⊖ NOUVEAU DOSSIER

Aucun dossier pour ce patient

© 2025 KineStat - Licence MIT - HERS Section Informatique

FIGURE 2.11 – Page d'anamnèse du patient : Partie 2



Voici les pages qui vont s'afficher lors de la création d'un nouveau dossier, suivi de la création d'un bilan :

FIGURE 2.12 – Page de création d'un nouveau dossier

FIGURE 2.13 – Page de sélection de bilan du kinésithérapeute

FIGURE 2.14 – Page de création d'un nouveau bilan



Patients / Anamnèse - Alexandre Leroy / SOCRATE

← REVENIR AU DOSSIER

① QUESTIONNAIRE SOCRATE

5 Site
Où se situe la douleur ? Pouvez-vous montrer exactement où ?

0 Onset (Début)
Quand la douleur a-t-elle commencé ? Comment a-t-elle débuté (progressive, soudaine) ?

FIGURE 2.15 – Début de la page d'encodage SOCRATE

Patients / Anamnèse / Dossier / SOCRATE / Red Flags

← RETOUR **⚠ RED FLAGS** → SUIVANT

TUMEUR / MÉTASTASE	INFECTION	NEUROLOGIQUE	TRAUMATISME / FRACTURE	INFLAMMATOIRE	VASCULAIRE / CIRCULATOIRE
--------------------	-----------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------

Antécédent personnel de cancer (localisation/année). ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

Antécédent familial de cancer significatif. ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

Perte de poids inexpliquée (>5% en 3-6 mois). ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

Douleur nocturne sévère, réveillant le patient. ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

FIGURE 2.16 – Questionnaire : Partie RedFlags

Patients / Anamnèse / Dossier / SOCRATE / Red Flags / Examen Clinique

← RETOUR **EXAMEN CLINIQUE** SUIVANT →

ARTICULAIRE / STRUCTUREL	NOCICEPTIF	NEUROPATHIQUE	ÉMOTIONNEL / AFFECTIF	CROYANCES ET COGNITION
--------------------------	------------	---------------	-----------------------	------------------------

SOCIO-ENVIRONNEMENTAL NOCIOPLASTIQUE

Age > 50 ans
☒ OUI ☐ NON ✎ AJOUTER UNE NOTE

Compression +
☒ OUI ☐ NON ✎ AJOUTER UNE NOTE

Distraction +
☒ OUI ☐ NON ✎

FIGURE 2.17 – Questionnaire : Partie Examen clinique



Patients / Anamnèse / Dossier / SOCRATE / Red Flags / Examen Clinique / Tests

← RETOUR **ÉVALUATION COMPLÈTE** → PASSER AUX RÉSULTATS

PROGRESSION GLOBALE 1 / 65

2/6

Évaluation Articulaire 0/23 Non commencé

23 test(s) à effectuer

Commencer

Tests Myofasciaux 1/5 En cours

5 test(s) à effectuer

Continuer

2.4 DOULEUR REPRODUITE A LA COMPRESSION MUSCULAIRE ? RV+ 3 Expertise Clinique Complété

POSITIF NÉGATIF

FIGURE 2.18 – Questionnaire : Évaluation complète

À la fin d'un bilan, nous avons un aperçu des résultats, et nous pouvons enregistrer le bilan. La figure suivante (la figure 2.19) est la page sur laquelle nous nous trouverons lorsque nous voudrions consulter les détails d'un bilan déjà enregistré.

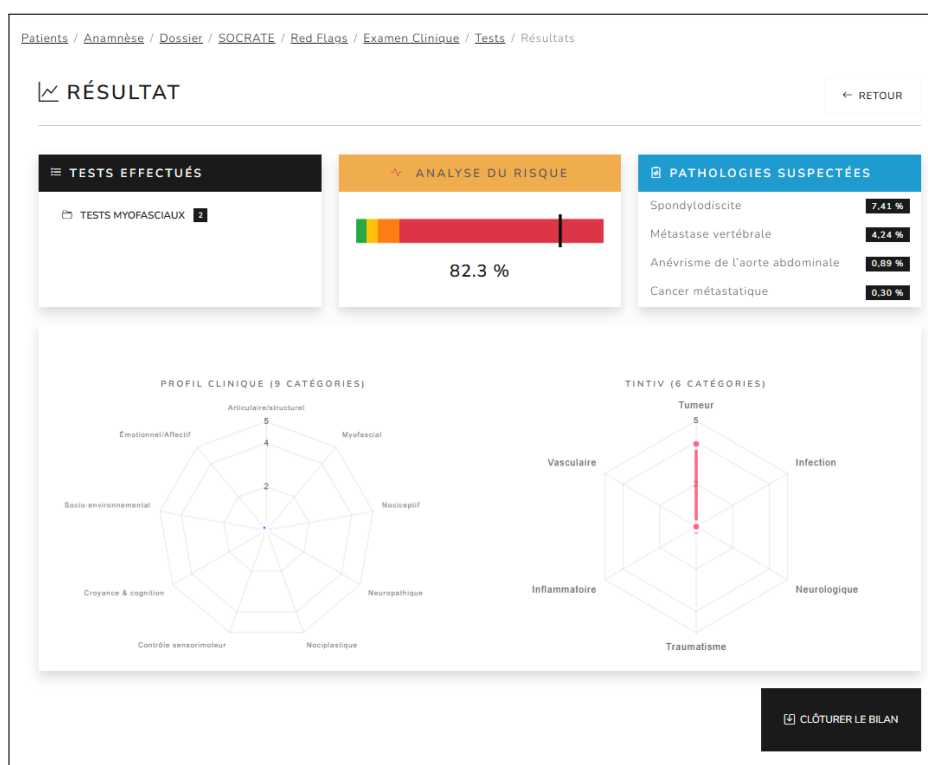


FIGURE 2.19 – Page des résultats du bilan



Et voici les détails du bilan :

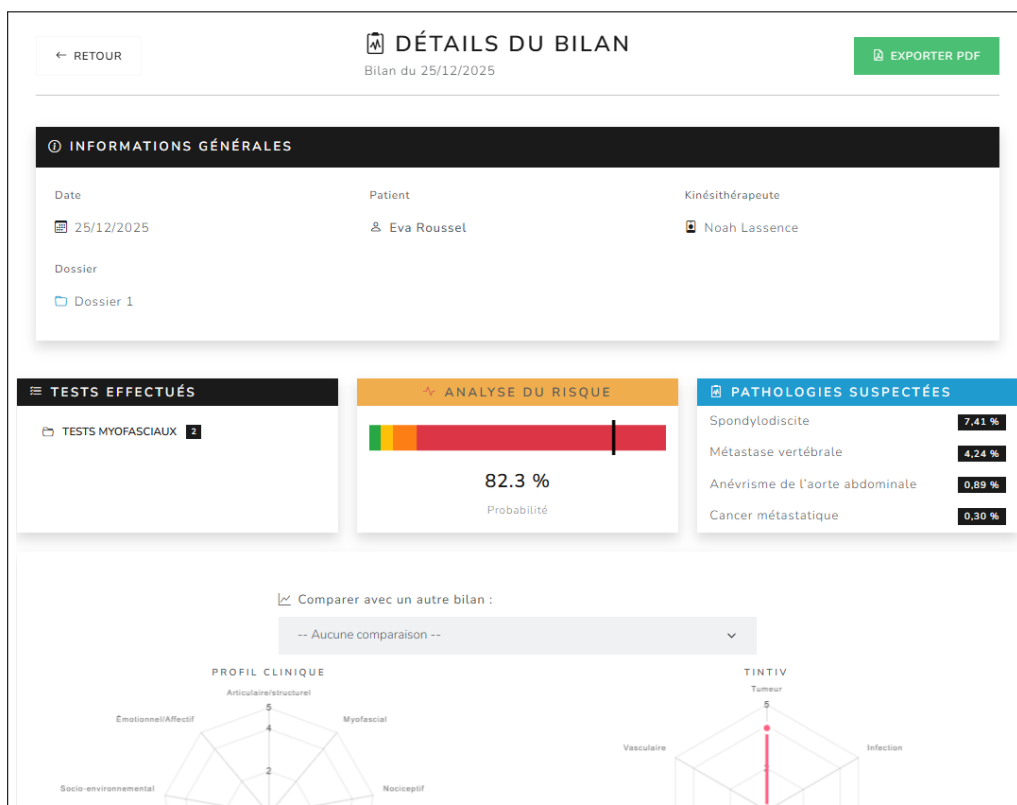


FIGURE 2.20 – Page des détails du bilan : Partie 1

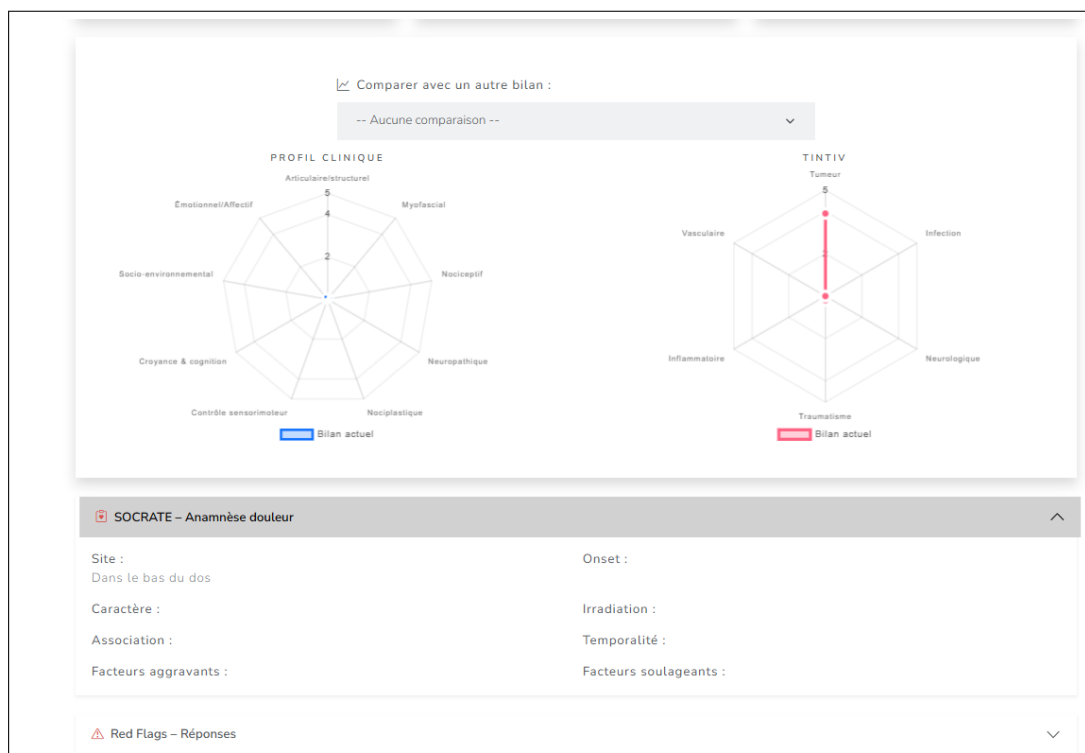


FIGURE 2.21 – Page des détails du bilan : Partie 2



Enfin, voici la fonctionnalité qui permet de modifier un patient :

← RETOUR A LA LISTE

MODIFIER LE PATIENT

Nom * Prénom *

Andre Chloé

Statut Genre * Date de naissance *

Actif Femme 09/09/1999

Email * Téléphone *

chloe.andre@example.com +32 486 898 081

Adresse

Rue Haute 1, 1000 Bruxelles

Pays * N° Sécurité sociale *

Belgique 05.01.29-229.12

Kinésithérapeute * Poids (kg)

Jean-Elly Fanoux (INAMI: 789101) 54

Taille (cm)

163

Médecin traitant

-- Aucun médecin --

⊕ AJOUTER UN NOUVEAU MÉDECIN

NOUVEAU MÉDECIN

Nom * Prénom * N° INAMI *

Victor Letellier 13546846131

ANNULER ENREGISTRER

FIGURE 2.22 – Popup de modification d'un patient



Afin de ne rien dévoiler lors d'erreurs sur notre application, nous avons créé des pages d'erreurs modifiées, afin de ne pas laisser transparaître d'informations inutiles pour l'utilisateur (bonne pratique vue au cours de Mr Schalkwijk) :

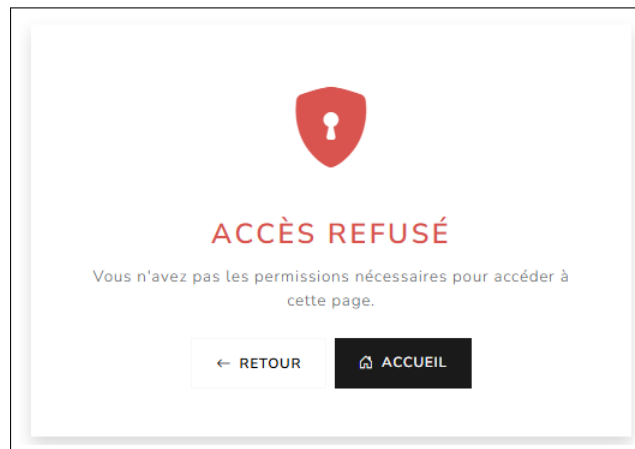


FIGURE 2.23 – Erreur : Accès refusé

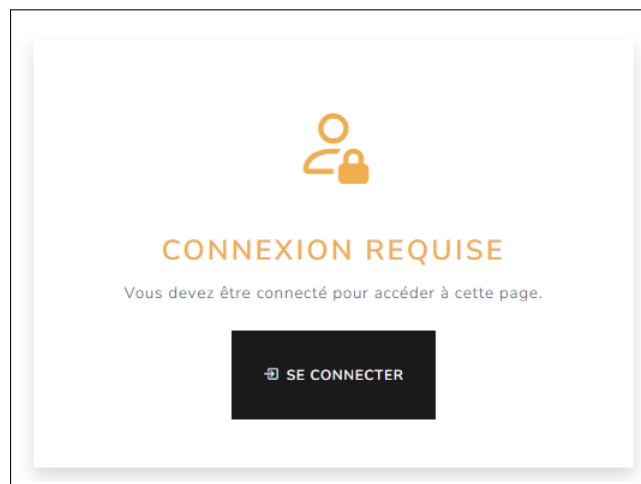


FIGURE 2.24 – Erreur : Accès non autorisé



3 Base de données

Nous avons beaucoup avancé sur la base de données, pour le moment, elle est en local sur chaque machine des participants du projet. Nous la mettons à jour dès que nous avons besoin de modifier un attribut ou une table, et nous nous partageons les scripts **SQL**.

Nous l'améliorons dès que nous avons besoin de le faire. Malheureusement, nous aimerions avoir une base de données définitive, mais les demandes des clients évoluent, ce qui nous contraint à modifier la base de données actuelle (*ajouter des relations, des attributs, ...*).



4 Fonctionnalités ajoutées

Ce chapitre va détailler les fonctionnalités ajoutées lors de ce sprint, qui ne sont pas visibles directement dans les captures d'écran plus haut.

4.1 Sécurisation des controllers

Nous avons sécurisé l'accès aux pages en appliquant des filtres d'autorisation sur tous les **controllers**. Ces filtres vérifient le rôle de l'utilisateur (*Admin ou Physio*) et garantissent qu'un kinésithérapeute accède uniquement aux dossiers de ses propres patients. En cas d'accès non autorisé, l'utilisateur est redirigé vers des pages d'erreur personnalisées (401, 403) sans révéler de détails techniques. Cette protection assure la sécurité et le respect du RGPD.

4.2 Test du calcul de Bayes

Nous avons montré notre classe du calcul de Bayes à Mr Spies, qui nous a confirmé qu'elle était fonctionnelle. De plus, il nous a donné des données pour tester, nous les avons mises dans nos tests unitaires, et tout passe parfaitement. Encore merci à Mr Spies pour son implication.

4.3 Exportation du bilan au format PDF

Le fait de pouvoir exporter les détails d'un bilan directement au format PDF nous a semblé être un vrai plus, nous l'avons donc implémenté, en en « mettant trop » (*actuellement, nous exportons tout*), cela va permettre de montrer cette fonctionnalité au client, et voir ce qu'il veut retirer/modifier (ce sera plus simple de retirer ce qui n'est pas utile plutôt que de devoir rechercher des données dans le programme par après).

4.4 Optimisation pour tablettes

Comme l'a précisé le client, l'application pourrait être utilisée assez souvent sur tablette, nous avons donc optimisé l'affichage de nos pages pour ce type d'appareils.



5 Rétrospective de sprint

5.1 Retranscription des retours obtenus à l'oral

5.1.1 Clockify

- Tout est ok, nos nombres d'heures sont +/- semblables, il n'y a pas trop d'écart.

5.1.2 Product backlog

- Tout ce que nous avons écrit a été respecté.

5.1.3 Pages web

- Des remarques ont été faites, elles sont surtout mineures, elles ont été prises en compte, et les modifications seront appliquées le plus vite possible, avant le prochain **Sprint Review**, mais rien de grave.

5.1.4 Autre

- Notes prises pour les modifications finales (exportation PDF, informations à déplacer, boutons à modifier, ...), tout sera effectué lors du dernier sprint.



5.2 Difficultés rencontrées

5.2.1 Au niveau du groupe

Au niveau du groupe, la principale difficulté rencontrée concerne le stress à l'approche de l'échéance finale du projet. L'accumulation des travaux à rendre en même temps pour d'autres cours a également augmenté la pression sur tous les membres. De plus, la grippe de Melvyn en fin de sprint a nécessité des réajustements, mais nous nous en sommes très bien sortis.

5.2.2 Au niveau individuel

Prénom	Difficultés rencontrées
Jean-Elly	— Échéance qui approche à grands pas.
Joanna	— Stress de fin du projet, beaucoup de travaux à rendre en même temps.
Melvyn	— Tomber malade et être incapable de faire quoi que ce soit. — Remise en question permanente sur le projet et sa réussite alors qu'il ne faudrait pas.
Noah	— Rien de notable, peut-être un peu le stress provoqué par le rapprochement de l'échéance finale.
Ryan	— Un peu de stress vu que c'est la fin du projet, et que l'échéance finale approche. — Beaucoup de travaux à rendre en même temps.
Sacha	— Concernant le projet en lui-même rien de spécifique. Juste un peu de fatigue de fin de cursus et l'accumulation des travaux.

TABLE 5.1 – Difficultés rencontrées par les membres du groupe



5.3 Tâches prévues pour le prochain sprint

Voici la liste des tâches prévues pour le prochain sprint :

- Faire le rapport,
- Tester la sécurité du site,
- Faire les différents diagrammes,
- Se renseigner sur le lecteur **Eid**, et l'implémenter si possible,
- Mettre en place les certificats **SSL**,
- Ajouter des animations au site,
- Réparer/modifier certaines choses dites au **SR**.

Remarque

Cette liste est non exhaustive ; certaines choses vont naturellement se rajouter au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors du prochain sprint.
